


1 · PANNEAU P1 — ÉLÉVATION, COUPES, OPTION FAÇADE

éch. élévation ≈ 1:12 · coupes 1:2



COUPE A-A (tronçon) — treillis & enrobage

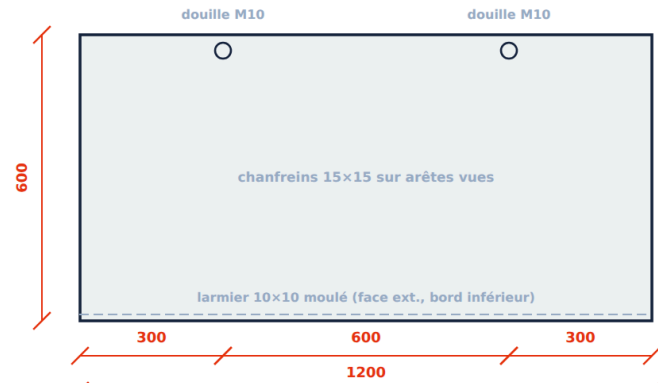

COUPE B-B — rive basse



OPTION « PACK FAÇADE » — insert fausses assises [HYP — moule d'essai]



joints creux moulés au pas de 200  
→ le joint RÉEL (10 mm, à 600) devient  
une ligne d'assise parmi les autres


DONNÉES DE FABRICATION — P1

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensions / épaisseur | 1200 × 600 × 60 · tol. ±3                 |
| Poids                  | 104 kg (4 porteurs = 26 kg/pers)          |
| Béton                  | C30/37 · E/C ≤ 0,45 · Dmax 10 [ING-001]   |
| Armature               | ST25C GALVANISÉ centré · enrobage 27      |
| Levage                 | 2 douilles M10 à 300 des rives            |
| Chanfreins / larmier   | 15x15 arêtes vues · 10x10 rive basse ext. |
| Décoffrage / cure      | ≥ 12 MPa (≈24 h) · cure humide 7 j        |
| Option façade          | insert fausses assises pas 200 [HYP]      |


2 · POTEAU RAINURÉ — ÉLÉVATION & SECTIONS

éch. élévation ≈ 1:18 · sections 1:2

platine 100x100x8 + 2 douilles M12 (moulée)

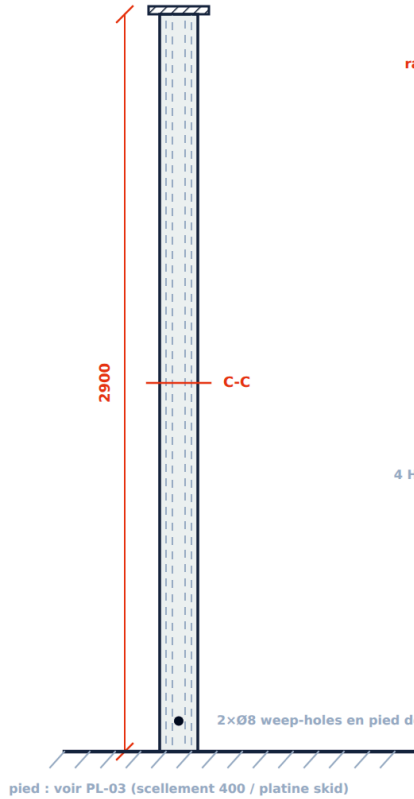


SECTION C-C — POTEAU COURANT

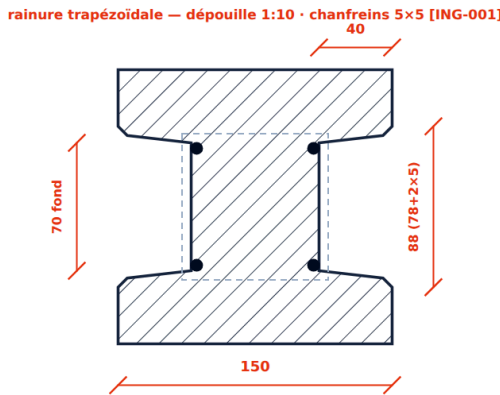

4 HA12 + cadres HA6 @150 — implantation de principe [TBV ferrailage]

SECTION — POTEAU D'ANGLE (rainures à 90°)

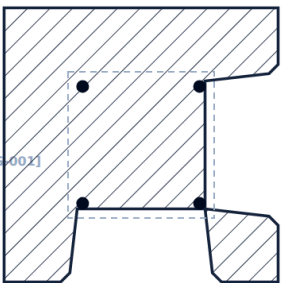


mêmes cotes de rainure — 2 faces adjacentes

CALEPIN STUDIO : 10 poteaux courants + 4 angles = 14

Moule unique à réglottes amovibles (courant/angle) [HYP atelier]

3 · ASSEMBLAGE — PANNEAU EN RAINURE (coupe horiz.)

éch. ≈ 1:1,5

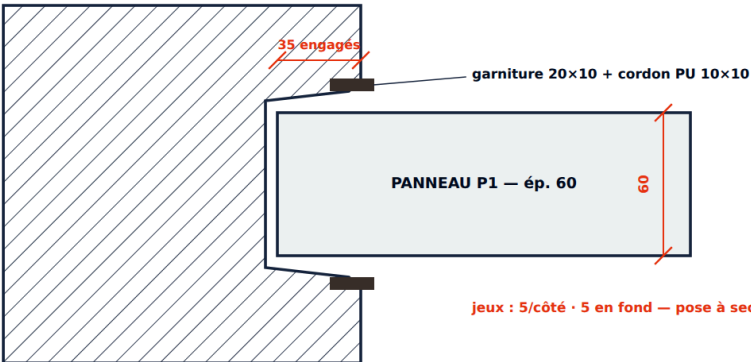

le panneau GLISSE du haut : aucun boulon, démontable (location)

drainage rainure : weep-holes Ø8 en pied

CONTRÔLES DE RÉCEPTION ATELIER

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Cotes hors-tout (chaque pièce)    | ±3 mm                              |
| Gabarit rainure passe / passe-pas | 70 fond · 78 ouverture             |
| Enrobage (pachomètre)             | ≥ 25 mesuré (visé 27)              |
| Pesée P1 (balance)                | 104 kg ± 5                         |
| Traction douille M10 (1/lot)      | ≥ 4x charge levage [TBV E5]        |
| Résistance décoffrage (cube)      | ≥ 12 MPa à 24 h                    |
| Cure humide                       | 7 jours consignés au registre      |
| Rectitude poteau (cordeau)        | flèche ≤ 5 sur 2900 [HYP]          |
| Essais système                    | réf. E1-E8 (ING-001) + E9 arrosage |

Rappel : ZÉRO coupe et ZÉRO perçage structurel sur site —  
toute réservation (guichet, hublot, fluides) est MOULÉE en usine.
